

Mgr. Tomáš Třetina, senátor a starosta

Zámek Moravský Krumlov


Krátce k historii zámku

- Renesanční zámek stojí na místě původního hradu. V 16. století ho přestavěli páni z Lipé. Svůj rukopis zde zanechal italský stavitel Leonardo Garo de Biso. Rod Liechtensteinů je s Moravským Krumlovem spjat od roku 1624.
- Posledními majiteli zámku byli Kinští. Po druhé světové válce bylo město Moravský Krumlov vybombardováno Rudou armádou, zámek jak zázrakem přežil. Přesunuly se sem úřady a později také odborné učiliště.

Moravský Krumlov zachránil zámek

- V roce 1992 za symbolickou jednu korunu dostala zámek akciová společnost Zámek, která objekt podrobila stavebně historickému průzkumu. Ten však nedokončila a ze zámku s půjčkami od bank odešla.
- V roce 2004 koupila zámek v dražbě společnost Incheba Praha. Budovy chátraly.
- V roce 2016 se podařilo městu získat zámek do svého vlastnictví.
- Září 2019 začíná rekonstrukce jižního křídla a zámecké věže.

Příprava v roce 2017

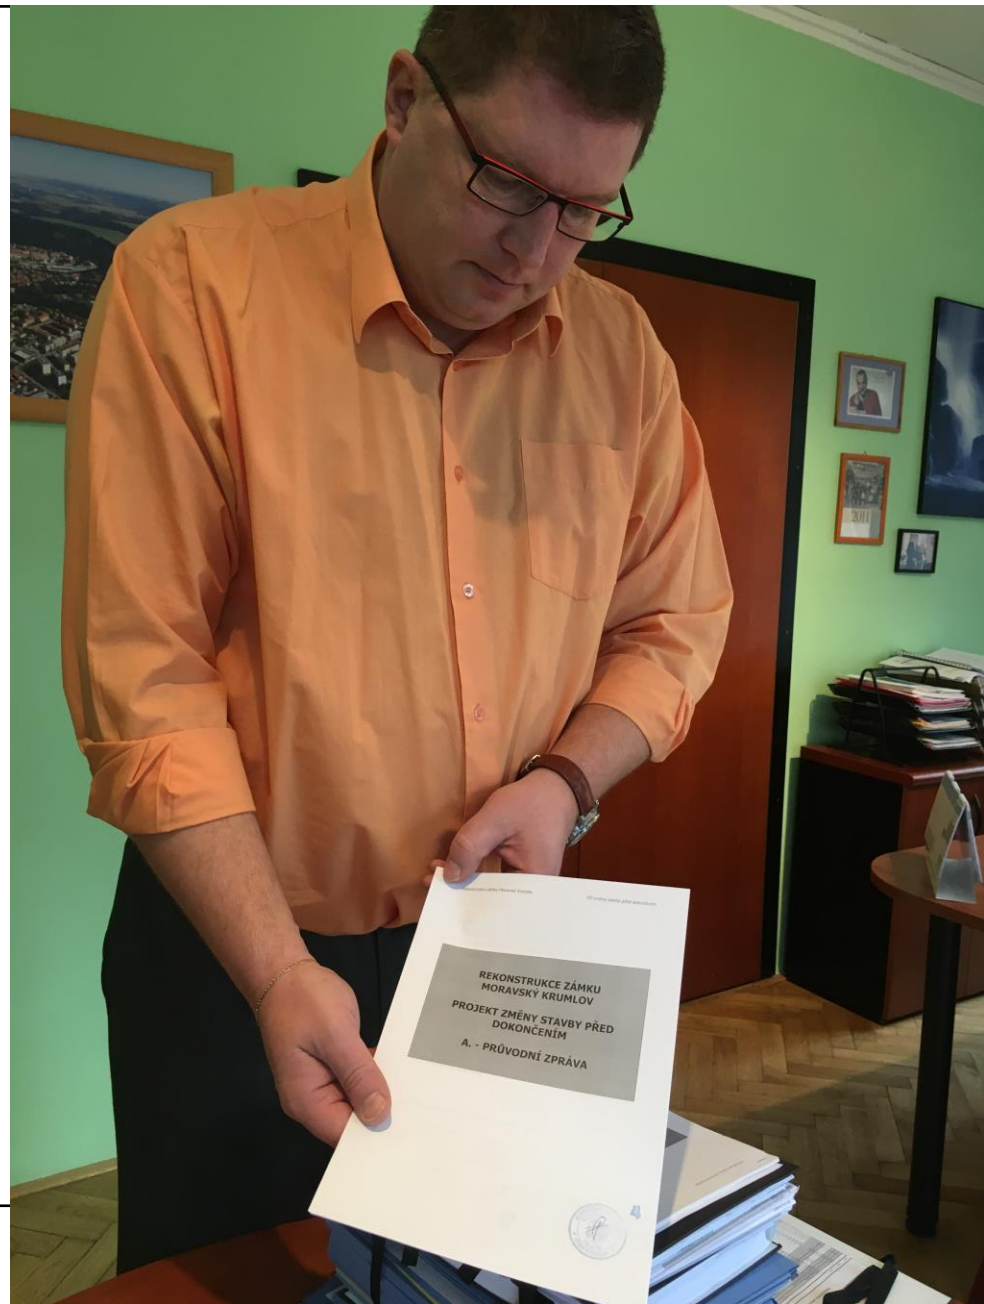

Naše cesta k rekonstrukci zámku

- Architektonická studie zpracovaná architektem Zdeňkem Fránkem (potřebovali jsem znát předpokládané náklady).
- Čekali jsme (a hledali) dotační titul.
- Listopad 2016 – byla vybrána společnost Renards dotační, s.r.o. na podání žádosti o dotaci a zajištění realizačního managementu včetně zpracování Studie proveditelnosti.
- 14. 3. 2017 jsme podali žádost o dotaci do systému, následoval proces kontroly a doplňování žádosti.
- 13. 12. 2017 vyhlášíme výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace na provedení stavby – vítězem je Atelier 99, v únoru 2018 startuje projektování, 29. 6. 2018 přebíráme projektovou dokumentaci.
- V březnu 2018 – vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 99, 87 mil. Kč



Poklepání základního kamene, léto 2019

REKONSTRUKCE ZÁMKU
MORAVSKÝ KRUMLOV

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR


Rekonstrukce trvala 2 roky

- Výběr zhotovitele (= firma, která zámek opraví) - výběr prováděla firma RPA (Regionální poradenská agentura), vypsání zadávacího řízení na zhotovitele 1. 11. 2018, rozhodnutí o výběru 19.6. 2019.
- Město Moravský Krumlov podepisuje smlouvu se zhotovitelem ARCHATT PAMÁTKY se společníkem OSP MORAVSKÝ KRUMLOV dne 25.7. 2019.
- Předáváme staveniště 3. 9. 2019.
- Dne 20. 12. 2021 přebíráme **rekonstruovanou věž a jižní křídlo zámku**.
- Jaro 2022 vybíráme mobiliář do budoucího Informačního centra a výstavních prostor.
- Jaro 2022 intenzivní spolupráce s Národním památkovým ústavem – zápůjčky původního historického mobiliáře, vybavení šlechtických komnat.







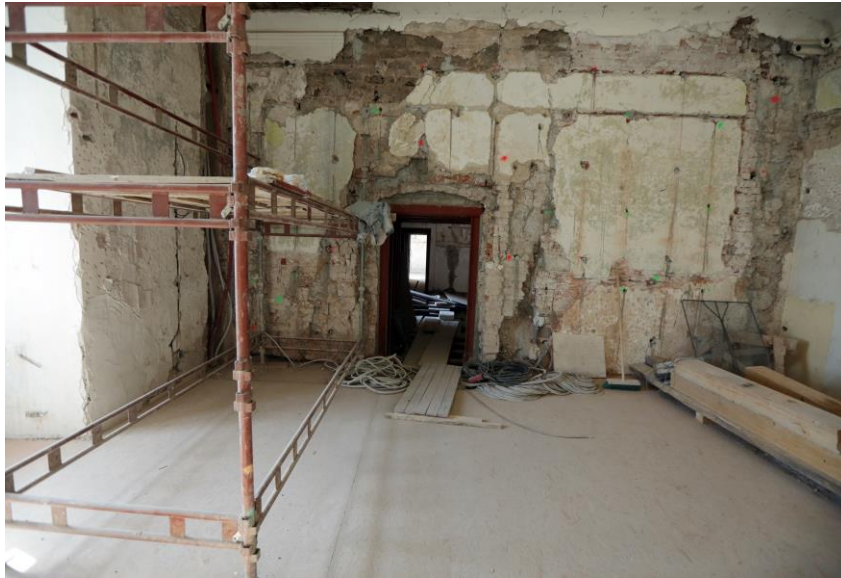






Projektant míní, realita mění

- Statika zámecké věže byla v horším stavu než byly odhady – po odstranění omítek byly zjištěny závažné poruchy, trhliny šířky až několik centimetrů, kaverny ve zdivu. Proto musel být navržen nový postup statického zajištění 2. a 3. NP věže. Trhliny byly vyplněny materiálem dostatečné pevnosti a přilnavosti, bylo použito velké množství kotev pro spojení zdi, provedeno stažení zdiva věže – zde došlo k prvnímu velkému navýšení ceny oproti původnímu plánu.
- Archeologické nálezy na nádvoří – musela být nově navržena trasa kanalizace oproti projektu, aby nedošlo k poškození nálezů – došlo k navýšení ceny oproti původnímu plánu.
- Objev „vlčí jámy“ – jsme se rozhodli prezentovat. Muselo však být přepracováno požárně bezpečnostní řešení z důvodu nemožnosti využití zadního vstupu. Úpravami vznikly další práce.



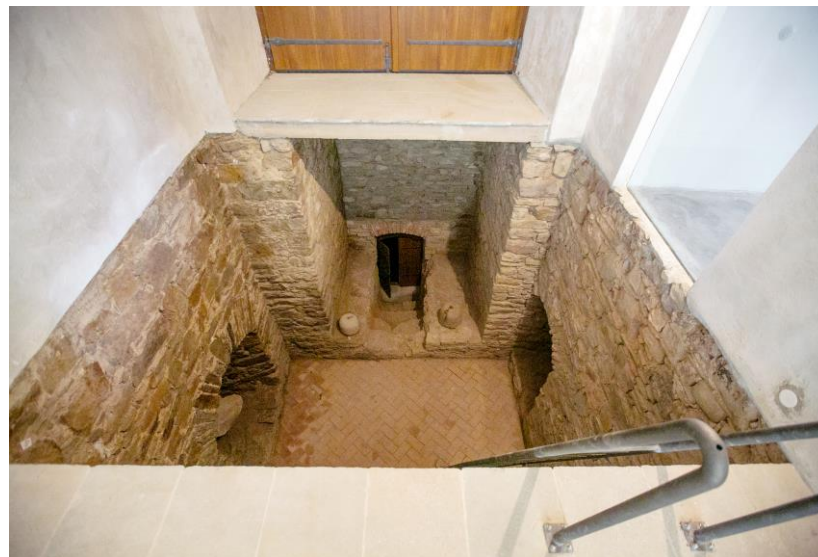

Zámek jsme otevřeli pro veřejnost v červenci 2022



OKRUH 1: SLOVANSKÁ EPOPEJ

vstupné: 250/150 Kč

Expozice 20 Muchových pláten



OKRUH 2: ŠLECHTICKÉ KOMNATY

vstupné: 150/80 Kč

Komentovaná prohlídka zámeckých interiérů



OKRUH 3: ZÁMECKÁ VĚŽ

vstupné: 100/80 Kč

Věž, arkády, zámecký tunel - bez průvodce



PLUMMET DOWNWARDS IN AUSTRIAN
HALLS OF CONCENTRATION IN
THE CELEBRATION OF ASSASSINATIONS IN BUDAPEST
MAY 1944 (BY THE ARTIST)



THE CELEBRATION OF ASSASSINATIONS IN BUDAPEST
MAY 1944 (BY THE ARTIST)



Výstavní prostory pro Slovanskou epopej připraveny v roce 2020

- 2019: podali jsme žádost o **dotaci na Ministerstvo kultury** (Podpora a reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností)
- Leden 2020: obdrželi jsme oznámení o získání dotace ve výši 13 milionů.
- Únor 2020 – podali jsme žádost o navýšení finančních prostředků o 30 milionů na ministerstvo kultury. Žádosti bylo vyhověno a dotace byla navýšena na 43 milionů.
- **Individuální dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje:** žádost podána v říjnu 2019 – získali jsme 10 milionů.
- V prosinci 2019 od **Nadace ČEZ** příspěvek na osvětlení 500 000 Kč.
- Květen 2020: vše připraveno pro návrat Slovanské epopeje.
- **Připravili jsme výstavní prostory pro Slovanskou epopej včetně instalace technologií na zachování podmínek nutných pro expozici díla. Převoz Slovanské epopeje na zámek v červenci 2021.**





Finance

- Rekonstrukce jižního křídla a věže 159,7 mil. Kč vč. DPH.
- Úprava výstavních prostor pro Epopej 57 mil. Kč vč. DPH.

Další plány se zámkem

- Ministerstvo kultury připravuje nové nařízení vlády o prohlášení areálu zámku Moravský Krumlov za národní kulturní památku.
- Listopadové Zastupitelstvo Moravského Krumlova bude schvalovat zadávací dokumentaci na výběr zpracovatele projektových dokumentací pro stavební povolení a provedení stavby na západní křídlo, severní křídlo a přilehlý přístavek, aby došlo k funkčnímu propojení celého zámku, součástí prací bude vybudování výtahu v západním křídle, který umožní přístup imobilním návštěvníkům.
- Budeme usilovat o dotaci z IROP.

A photograph of a classic, ornate living room. The room features a large wooden bookshelf filled with books, a floral patterned sofa, and a chandelier. The walls are decorated with several framed portraits and smaller pictures. A small table with a teapot and cups is set in the foreground. The overall atmosphere is elegant and traditional.

Děkuji za pozornost.
